



**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** апрель 2018

**Заказчик:** #####

**Подрядчик:**

**Адрес объекта:** #####

Организация осуществляющая функции строительного контроля  
**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
20.03.2018	При устройстве каркаса используются не все монтажные крепления.		
29.03.2018	Не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство каркасов перегородок.		
11.04.2018	Между м/к и деревянными элементами фасадов не предусмотрена гидроизоляция.		
11.04.2018	Не обеспечен защитный слой бетона перекрытия		
12.04.2018	Объемы выполненных работ по разделам 1-4, 35 не соответствуют фактическим.		
17.04.2018	Торцы стропил и обрешетки не обработаны огнебиозащитой.	Устранено 19.04	
17.04.2018	Гидроизоляционный ковер заведен на вертикальную плоскость менее, чем 150 мм.	Устранено 19.04	

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист  
2

**Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :**

Дата:	Информация по выезду:	Инж
11.04.2018	Ведутся работы по устройству металлоконструкций террасы. Выполнено армирование перекрытия. Подготовительные работы по усилению проемов.	Стр-в
12.04.2018	Проверка акта выполненных работ № 22	Стр-в
17.04.2018	Выполнено устройство кровли в осях 7-9/В1-Г.	Стр-в

19.04.2018	Выполнены штробы в стене для прокладки канализации. Окончание работ по кровле.	Стр-в
26.04.2018	Устройство штроб для прохода инженерных разводок (водопровод, отопление, канализация). Штукатурка стен террасы.	

Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет апрель 2018	Лист
						3

**Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :**

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проектн. отметки о

допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист  
4

### Раздел 3. Фотоотчет :

Армирование перекрытия.

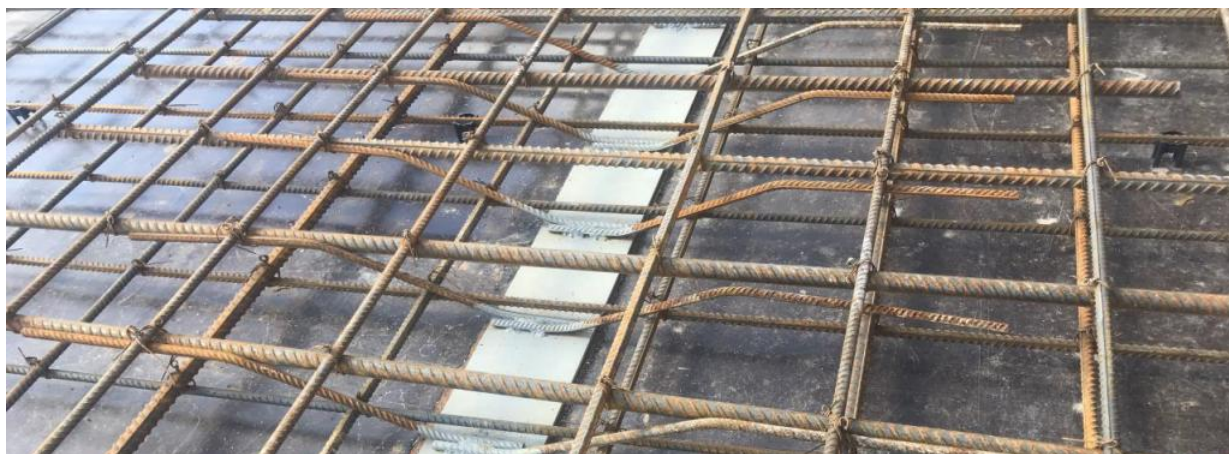



Устройство технологических отверстий для инженерных разводок.



5 выездов

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист  
8



**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

<b>Дата</b>	<b>Замечание/дефект:</b>	<b>Отметка об устранении</b>	<b>Примечания:</b>
17.04.2018	В осях 1-2/А выявлены повреждения гибкой черепицы и системы водостока.		
19.04.2018	Не предоставлена исполнительная документация на устройство Мки армирование террасы.		
26.04.2018			Маяки после оштукатуривания демонтировать.

Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв №  
 Подп. и дата  
 Инв. № Подп.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0

Лист  
т  
1
