



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: *Июнь 2018*

Заказчик:

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект:</i>	<i>Отметка об устранении</i>	<i>Примечания:</i>
01.06.2018		Выполнено 06.06.2018	После монтажа плитки очистить стены от клея и подготовить стены к сдаче.
08.06.2018		Выполнено	После затирки защитить керамогранит на полах оргалитом.
13.06.2018			Выставить конвекторы отопления по уровню чистового пола.
13.06.2018		Выполнено	Пустоты между стяжкой и конвекторами заполнить жидким цем.-песчаным раствором.
13.06.2018		Выполнено	Между плиткой и конвекторами предусмотреть деформационный шов.
20.06.2018	Над входной дверью места прохода коммуникаций не зачеканены негорючим материалом.		
20.06.2018	Швы между керамогранитом и конвекторами не заполнены герметиком.		

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист

2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
01.06.2018	Выполняется укладка керамогранитной плитки (гостинная, спальня). В гардеробной монтаж и затирка плитки.	Стр-в
04.06.2018	Выполняется укладка керамогранитной плитки и подрезка (гостинная, спальня).	Стр-в
08.06.2018	Выполняется укладка керамогранитной плитки на пол гостинной и спальни.	Стр-в
13.06.2018	Укладка керамогранита в спальне и гостинной.	Стр-в
20.06.2018	Укладка и подрезка керамогранитной плитки.	Стр-в
27.06.2018	Монтаж керамогранита, затирка, отмывка. Выполняется шпаклевка стен перед окраской.	Стр-в
	Выполнен комплекс работ по выпуску исполнительной документации раздела ЭОМ. (Приложено к отчету)	Заб-на

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист	3
из	

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы.
2	

Име. № дубл.	
Взам. ине №	
Подп. и дата	
Име. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Укладка керамогранитной плитки, 01.06.2018.




Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист
5

Укладка керамогранитной плитки, 08.06.2018.

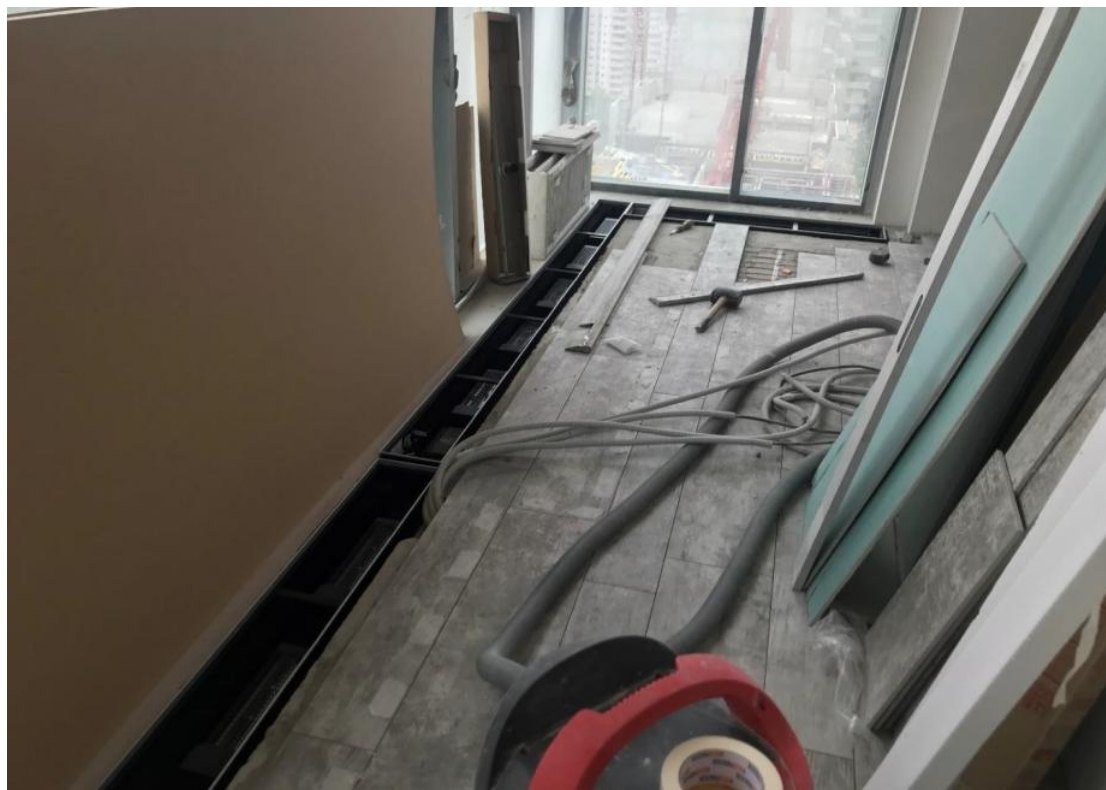

Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист
6

Примыкание керамогранитной плитки к конвекторам отопления, 13.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лис т
7

Отверстие над входной дверью не заполнено герметиком, 20.06.2018.



Защита керамогранита оргалитом от механических повреждений, 20.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лис т
8

Работы по подрезке и укладке керамогранитной плитки, 20.06.2018.




Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист	9
------	---

Проверка схемы электрического щита, 20.06.2018.

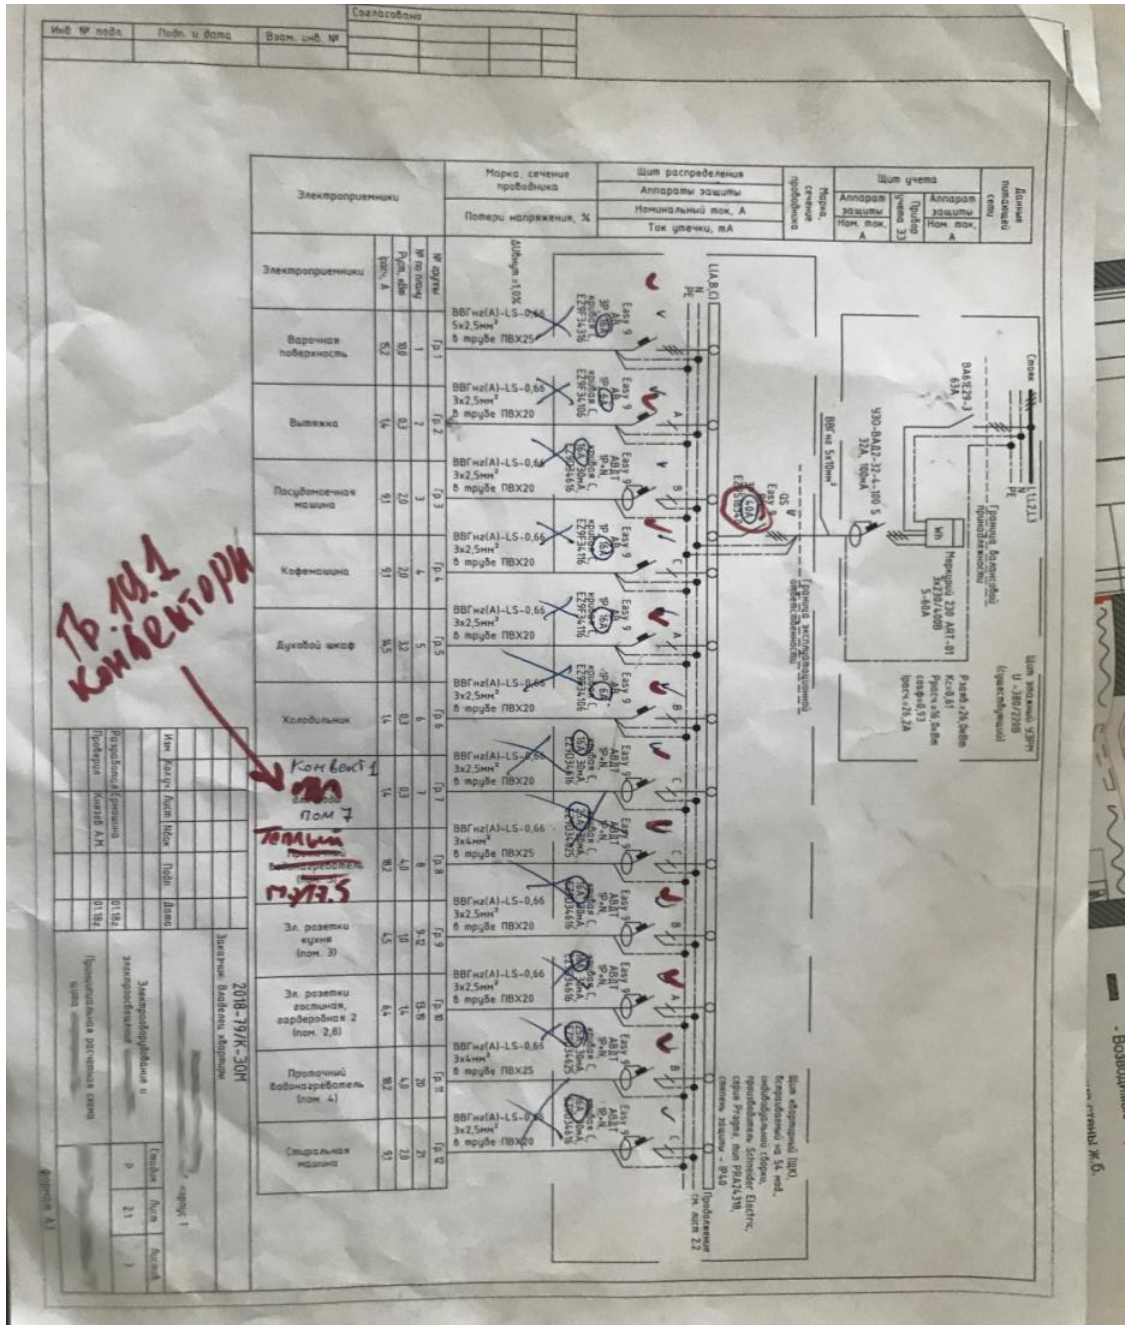

Тр. №1 Кондукторы

Ком. вкл. 1 пом. 7

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ине. № Подп. Взам. ине. № Ине. № дубл. Подп. и дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист 10

Затирка и отмывка керамогранитной плитки, 27.06.2018.



Ине. № Подп. Подп. и дата
Взам. ине № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Шпаклевание и подготовка стен к окрашиванию, 27.06.2018.



6 выездов + камеральная работа (подготовка исполнительной документации)

Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет июнь 2018

Лист	12
------	----
