



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

Период: **Июль 2017**

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
03.07.2017	Выполнить антикоррозионную обработку мет уголка для крепления панелей.		Замечания за июнь полностью устранены
04.07.2017	Заделать монтажной пеной швы между мк и панелями.		
07.07.2017	Выполнить обрамление торцов панелей, примыканий оконных и дверных блоков к панелям.		
27.07.2017	Смонтированные металлоконструкции покрасить в соответствии с требованиями ТЗ, оформить исполнительную документацию.		

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист  
2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
03.07.2017	Монтаж внутренних перегородок из сэндвич панелей	#####
04.07.2017	Монтаж внутренних перегородок из сэндвич панелей в осях N-Q	
06.07.2017	Выполнен монтаж перегородок из сэндвич панелей, устройство оконных и дверных блоков	
07.07.2017	Демонтаж "саркофага", обрамление оконных и дверных блоков в перегородках.	
С 10.07. по 16.07.2017	Работы на объекте не производились	
17.07.2017	Устройство "саркофага" на площадке обслуживания в осях N-L7/8	
18.07.2017	Демонтаж - монтаж венткоробов в осях N-L7/8. Демонтаж площадки обслуживания в осях N-L7/8	
19.07.2017	Демонтаж саркофага над площадкой обслуживания в осях N-L7/8	
20.07.2017	Проверка исполнительной документации на выполненные работы.(монтаж мк, бетонирование плиты платформы)	
21.07.2017	Приемка металлоконструкций.	

Инв. № Д

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист

3

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
22.07.2017	Монтаж мк (колонны, прогоны в осях А-В/10	#####
23.07.2017	Монтаж мк (консоли, швеллер в осях Q	
24.07.2017	Монтаж мк (консоли), в осях С-8/10, С-Е/8. Армирование плиты перекрытия платформы.(А-В/10, С-8/10, С-Е/8)	
25.07.2017	Бетонирование плиты перекрытия платформы в осях А-В/10, С-8/10, С-Е/8	
26.07.2017	Ремонтные работы саркофага. Уборка строительного мусора.	
С 27.07.2017	Работы на объекте не ведутся.	

Инв. № Д	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						4

**Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:**

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить ППР
2	Предоставить сертификаты на метизы
3	Авторскому надзору завести журнал контроля
4	Предоставить акты на скрытые работы

Подп. и д

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист

5

### Раздел 3. Фотоотчет:

Монтаж внутренних перегородок

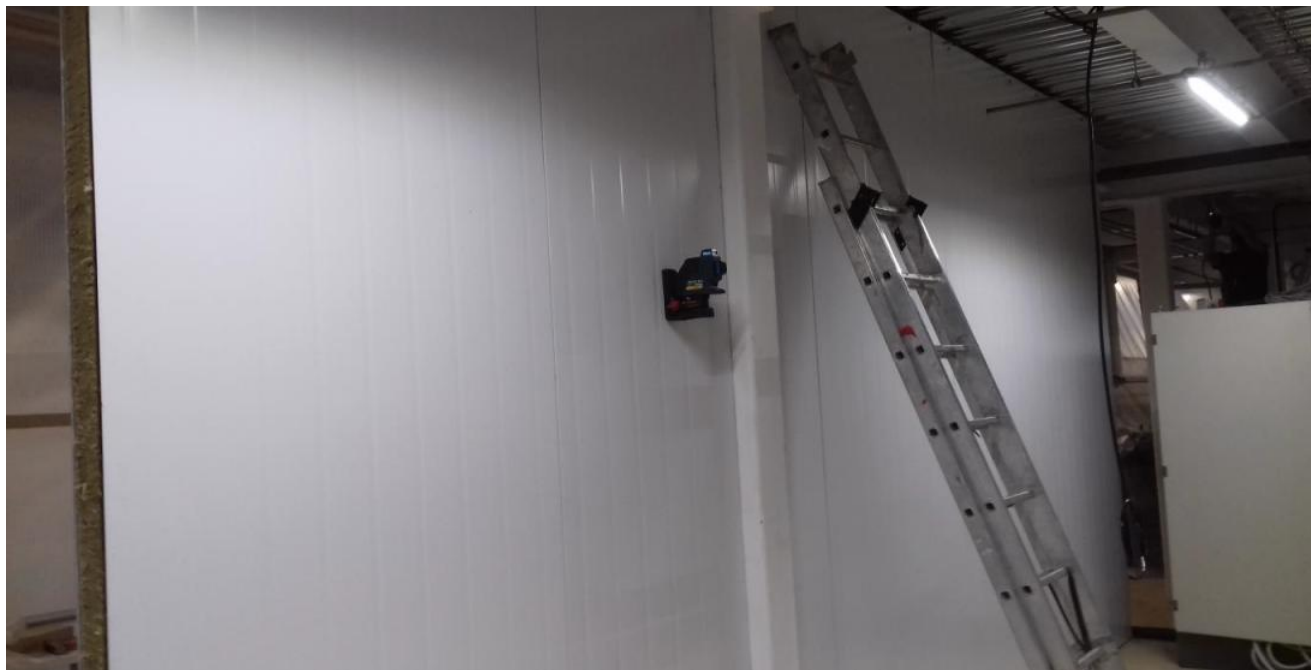

Уголок обработать антикоррозионными составами



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист

6

Обрамление оконных и дверных блоков



Устройство "саркофага" на площадке обслуживания в осях N-L7/8



Инва. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист
7

## Демонтаж венткоробов



## Монтаж мк платформы А-В/10



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист
8





Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист
9

Армирование плиты перекрытия платформы



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист
10

Бетонирование плиты перекрытия платформы



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет июль  
2017

Лист
11
