



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:

#####

Период:

Июль 2018

Подрядчик:

Адрес:

#####

Инд. № лист.	Подл. и дата

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома	Лист
					#####	
					июль 2018	
						1

Технадзор77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата:	Информация по выезду:	ИТН
03.07.2018	Установка СИП панелей стен 2-го этажа.	#####
09.07.2018	Смонтированы СИП панели стен 2-го этажа с обрезкой под уклон для монтажа кровельных панелей.	#####
30.07.2018	Устройство гидроизоляции перекрытия 2-го этажа.	#####

Ичп. № Годр.	Подп. и дата	Взам. испр. №	Ичп. № испр.	Подп. и дата

3 выезда

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома ##### июль 2018

Лист

3

Технадзор77

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

Nº	Наименование:
1	Проверка наличия паспортов на применяемые материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

Nº	Наименование:
1	
2	

Приемочный контроль. (специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

Nº	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы.
2	

Инд. № листа
Подп. и дата

Взам. инд №
Инд. № листа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
4

Раздел 4. Фотоотчет:

Монтаж СИП панелей стен 2-го этажа.



№ Пл.д.	Пл.д.	Взам. №	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

Строительство жилого дома
июль 2018

5

Технадзор77

Панели в наружном углу в осях А/4 не состыкованы на 6 мм в месте термошва.



№ п/п	Подп. и дата	Взам. № п/п	№ п/п	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
6

Намокание стен.



Инд. № Годин.	Годин. и дата	Взам. инд №	Инд. № земл.	Годин. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
7

Намокание стен.



Инд. № Гарант.	Подп. и дата	Взам. инд №	Инд. № земл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

лист
8

Стыковочные швы соединения панелей в местах оконных проемов не заполнены монтажной пеной.



Инд. № Гарант.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
9

Намокание стен из-за протечки горизонтального шва перекрытия 2-го этажа.



Инд. № Гарант.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
10

Устройство гидроизоляционного слоя перекрытия 2-го этажа.



Инд. № Годбр.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
11

Загрязнение панелей монтажной пеной.




Инд. № Гарант.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома
июль 2018

Лист
12

Соединение панелей, внешний угол (к замечанию от 03.07.2018 о нестыковке панелей).

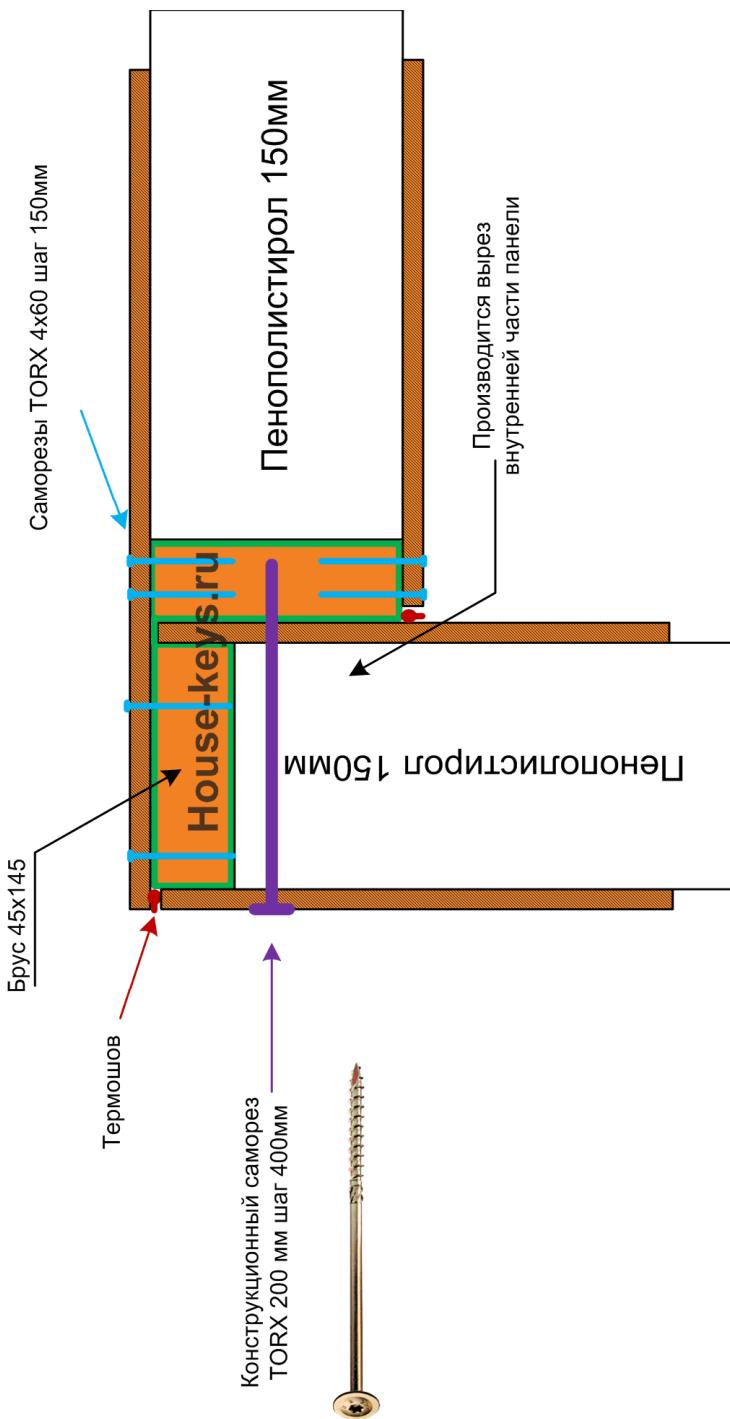

3 выезда

Инд. № Гл.д.	Гл.д. и дата	Взам. инд №	Инд. № Зубр.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома #####
июль 2018

Лист
13
