



Отчет работы строительного контроля

Период: *Декабрь 2017*

Заказчик: #####

Подрядчик: #####

Адрес объекта: #####

Организация осуществляющая функции строительного контроля **ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительно-монтажные работы, Отчет декабрь 2017

Лист	1
------	---

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об исправлении	Примечания:
	Замечания, отмеченные техническим надзором в журнале производства работ подрядчика за ноябрь 2017 г. устранены.		
01.12.2017	Выявлены сколы бетона на стене по оси 6		
07.12.2017	Выявлены раковины с оголенной арматурой в осях А/6-1		
13.12.2017	Каркасы колонн по оси В не выставлены по оси.		
19.12.2017	Щели между щитами опалубки.		
22.12.2017	Не обеспечен защитный слой бетона.		

Ине. № Подл. Подп. и дата
 Взам. ине № Инв. № дубл. Подп. и дата
 Подп. и дата
 Инв. № Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительно-монтажные работы, Отчет декабрь 2017

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	
01.12.2017	Устройство гидроизоляции ф. плиты в осях В-Г/3-1. Армирование ф. плиты в осях В-Г/8-5. Бетонирование стен цоколя в осях А-Б/6.	##### ####
05.12.2017	Армирование ф. плиты в осях В-Г/8-5. Бетонирование стен цоколя в осях А-Б/4-2.	##### ####
07.12.2017	Армирование ф. плиты в осях В-Г/4-8	##### ####
09.12.2017	Бетонирование фундаментной плиты в осях В-Г/1-8	##### ####
12.12.2017	Армирование стен и колонн. Бетонирование стен в осях А/2-1., 1/А-Б	##### ####
13.12.2017	Армирование стен и колонн цоколя.	##### ####
15.12.2017	Армирование стен и колонн. Бетонирование стен цоколя в осях В/4-5, Г/1-3	##### ####
19.12.2017	Монтаж опалубки плиты перекрытия цоколя.	##### ####
21.12.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя. Бетонирование стен цоколя в осях г/4	##### ####
22.12.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя. Бетонирование стен цоколя в осях Г/6, 8/Г	##### ####
25.12.2017	Бетонирование стен цоколя в осях 8/Б-Г. Приемка выполненных работ.	##### ####
26.12.2017	Бетонирование плиты перекрытия цоколя в осях А-Б/1-4	##### ####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия предоставлены
	Примененные материалы соответствуют требованиям проекта.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выполненные работы соответствуют проектной документации и СНиП.
2	Организация службы ТБ на площадке осуществлялась подрядчиком в полном объеме


Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Акты освидетельствования скрытых работ подписаны техническим надзором
2	Комплект оригинала исполнительной документации передан представителю Заказчика (#####).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел 3. Фотоотчет :

Устройство гидроизоляции ф. плиты

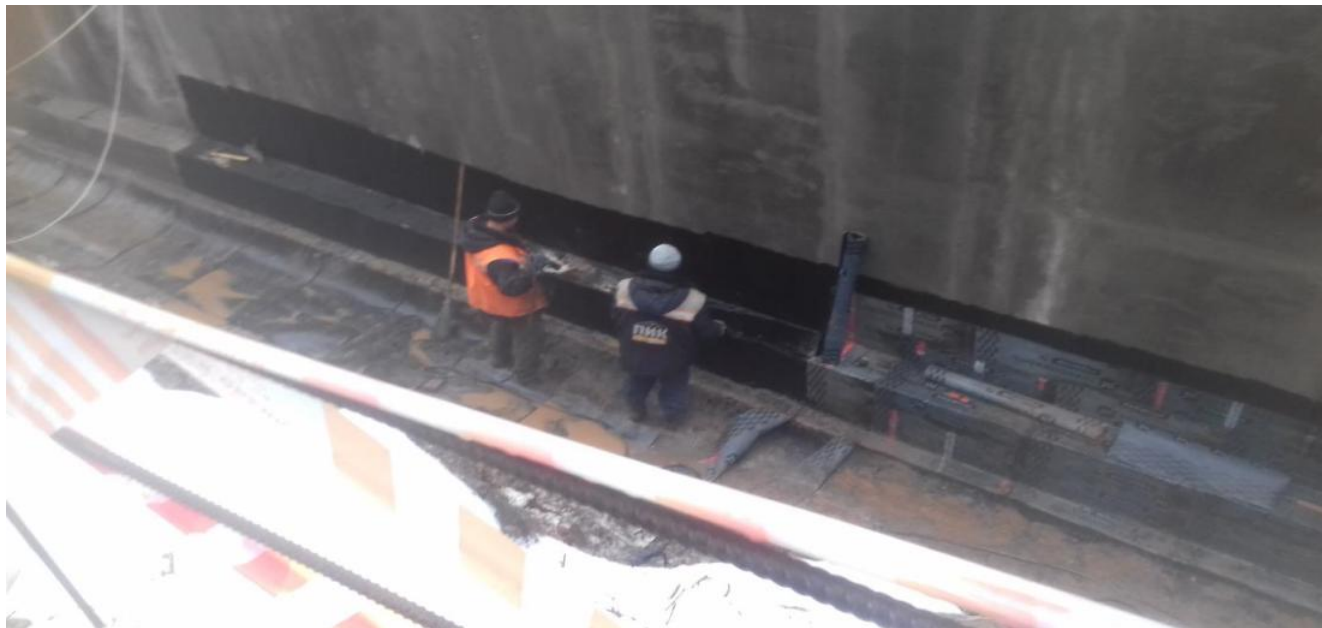

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
декабрь 2017

Лист
т
5

Армирование фундаментной плиты



Бетонирование стен цоколя



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
декабрь 2017

Лист

т

6



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
декабрь 2017

Лист
т

7

Армирование колонн



Бетонирование стен цоколя



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
декабрь 2017

Лист

8

Монтаж опалубки колонн




Монтаж опалубки перекрытия



Не обеспечен защитный слой бетона



Щели между щитами опалубки

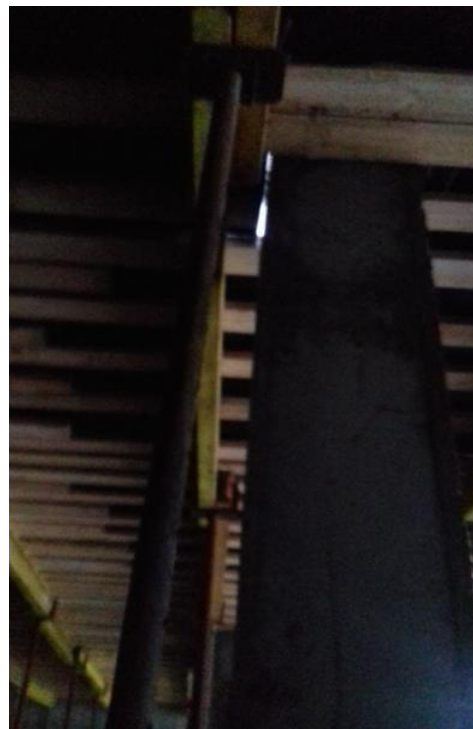

К оплате за 12 выездов 137 000,0 р

Инь. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инь. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительно-монтажные работы, Отчет декабрь 2017

Лист	9
------	---
