



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Сентябрь 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					1
Строительство жилого дома в #####					

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
24.11.2017	Выявлены мастики холода в местах примыкания стен и колонн 1-го этажа.		Необходима герметизация швов.
25.01.2018	На затирке трещины и раковин		
05.03.2018	Не затерта стеновая плитка в моечной	устранено частично	
08.08.2018	Щели между бревнами 1-го этажа в результате усадки.		
08.08.2018	Выявлены дефекты кладки камня покрытия въездной группы		
14.08.2018	Бетонные столбы забора стоят с перепадами по высоте и отклонением оси от вертикали.		
06.09.2018	Выявлены шероховатости на поверхности деревянных деталей забора.		
06.09.2018	Выявлено повреждение деревянного элемента (скол).		
08.09.2018	Выявлены шероховатости на элементах заполнения проемов забора.		
08.09.2018	На планкене забора не заделаны отверстия от крепежа.		
08.09.2018	На бетонных столбах не заделаны технологические отверстия.		
08.09.2018	Отклонение подпорной стенки в размерах до 50 мм.		
08.09.2018	Повреждены кабели обогрева въездной группы при ведении работ по монтажу забора.		
08.09.2018	Откатные ворота не подключены к электроснабжению.		

Подп. и дата
 Инв. № докум.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № Подп.

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
06.09.2018	Осмотр выполненных работ по устройству забора.	#####
08.09.2018	Комиссионное обследование выполненных работ.	#####


2 выезда

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам инд. №	Подп. и дата
Инд. № аудл.	Подп. и дата
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома в #####	Лист
						3

Раздел 3. Фотоотчет.

Шероховатости на поверхности.

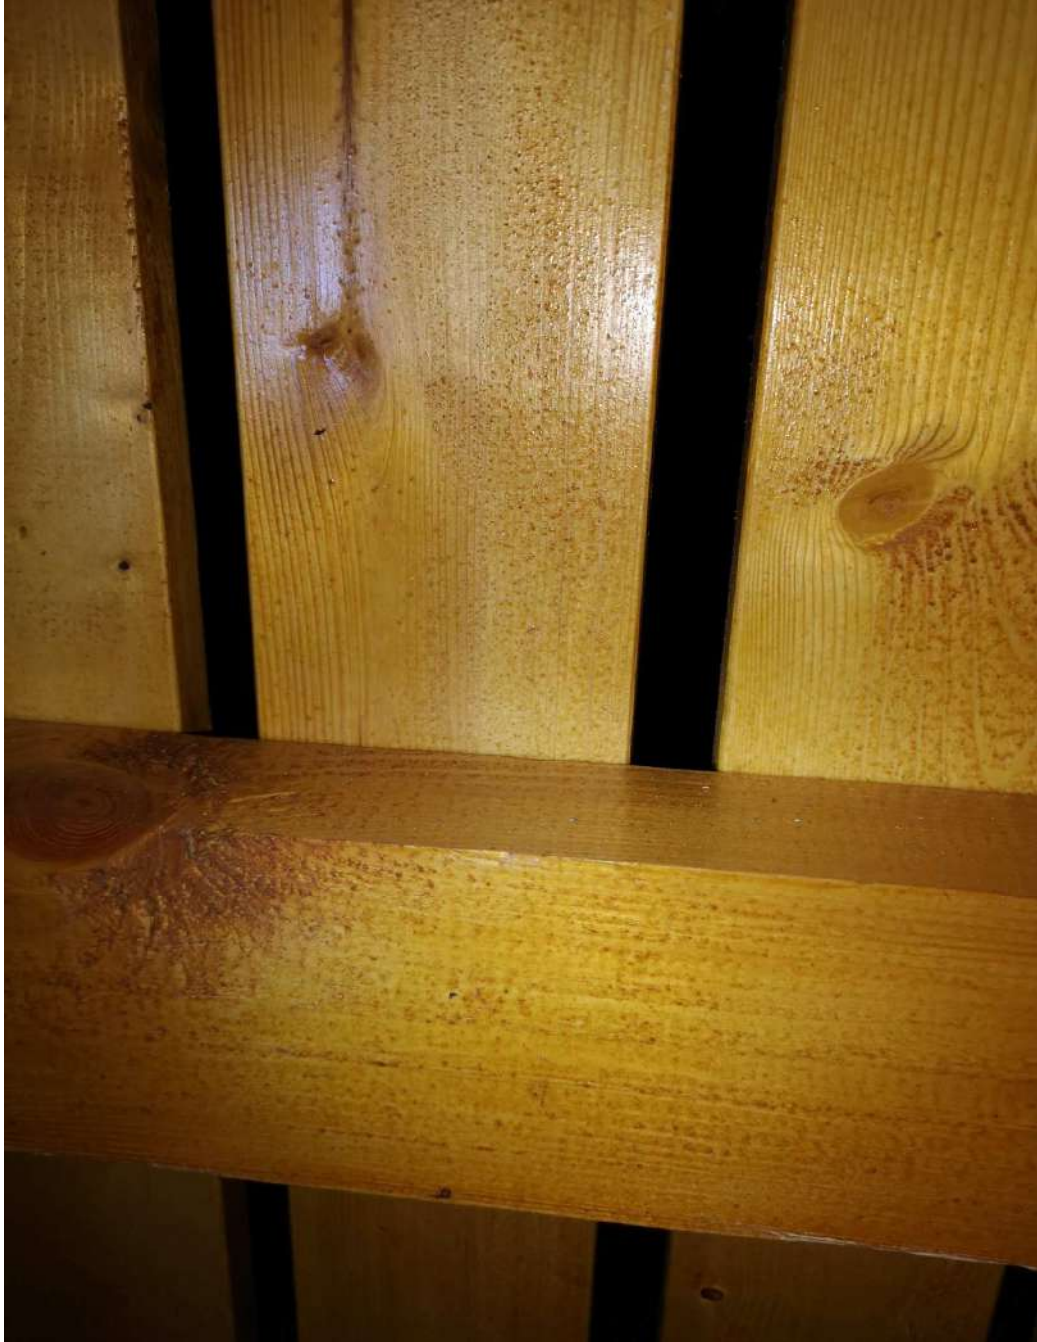

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####

Лист
4

Технадзор 77

Повреждение деревянного элемента.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####

Технадзор 77

Сучок более 1\2 толщины доски.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####

Лист
6

Технадзор 77

Обратная засыпка и гидроизоляция не выполнены.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####

Лист
7

Технадзор 77

Отметки на видимой декоративной поверхности.

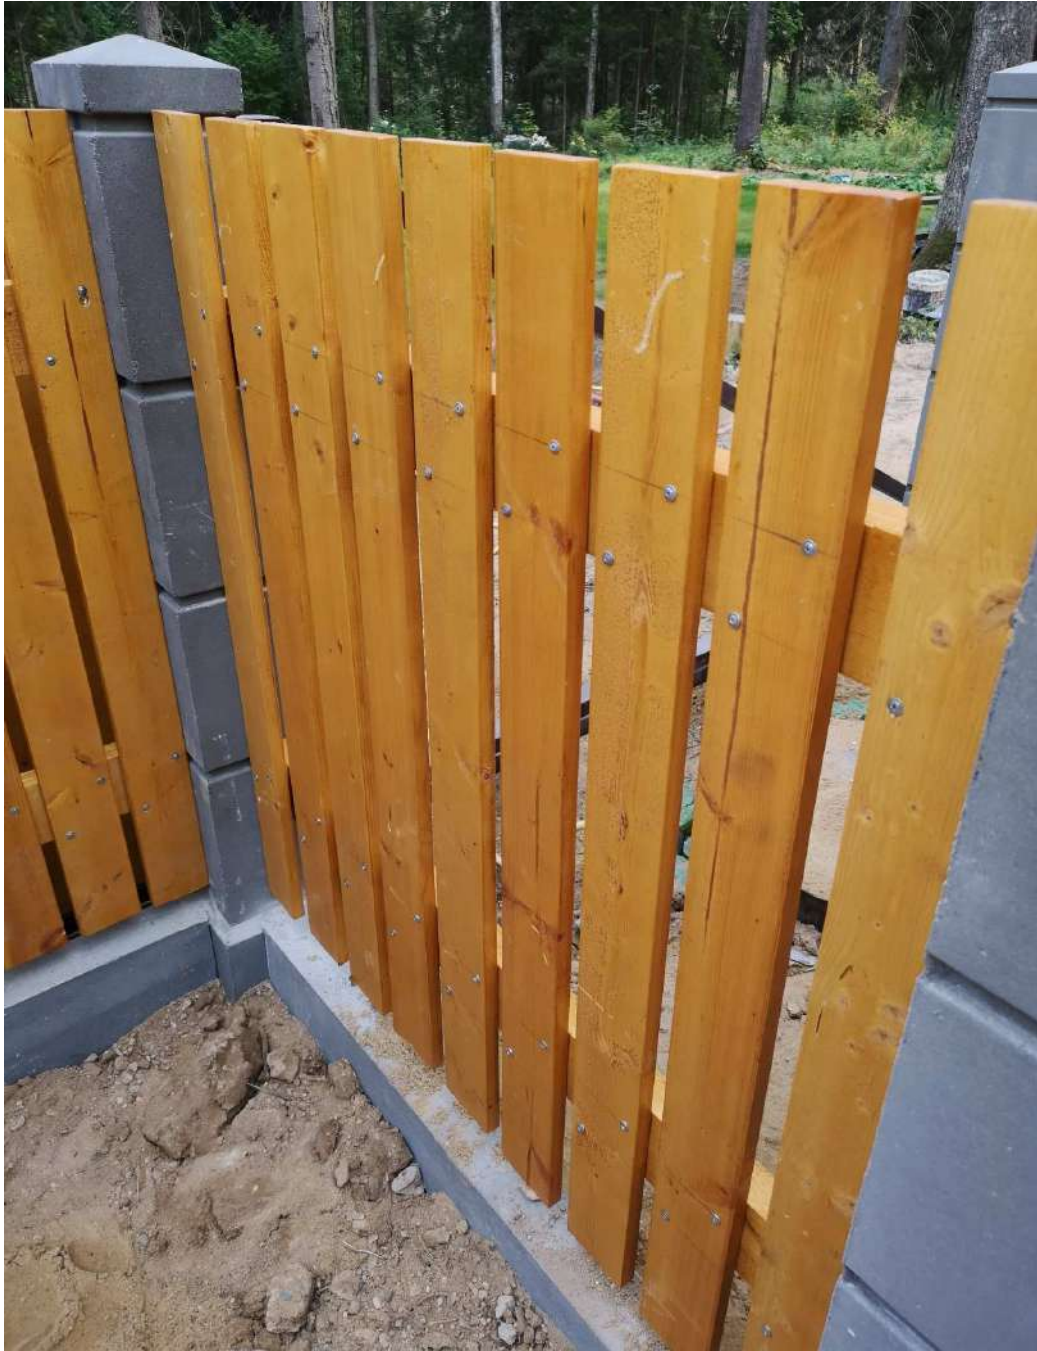

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####

Технадзор 77

Не выполнено примыкание столба к площадке.




Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####

Технадзор 77

Общий вид

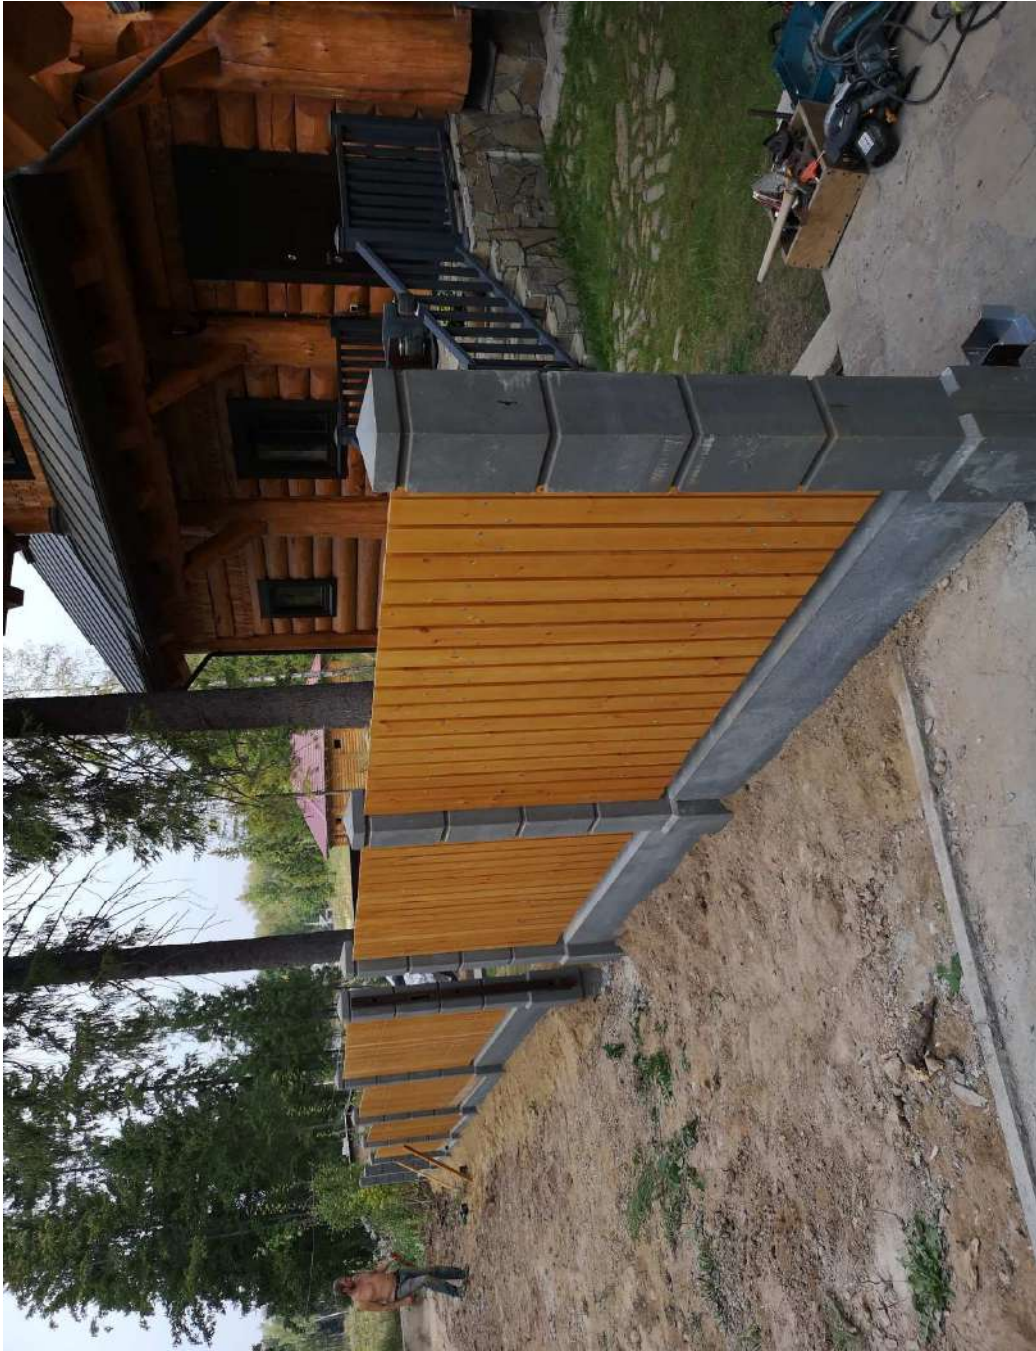

2 выезда

Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в #####
