



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: март 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес
объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
08.08.2017	Выявлено место снегового кармана, отсутствует гидроизоляция		
28.10.2017	Не принято вариантное решение по водопонижению и водоотведению.		
20.03.2018	Работы по оштукатуриванию подвала приостановлены (конденсат, мокрые участки штукатурки)		Повышенная влажность в подвале
20.03.2018	Раскрытие трещин на стяжках полов.		Отсутствие демпферной ленты.
20.03.2018	Провисание гибких воздуховодов, проходка воздуховодов через стены без гильз, в местах стыков отклеилась фольгизированная лента.		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет март 2018

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инж
-------	-----------------------	-----

15.03.2018	Устройство траншей под канализацию (дренаж). Монтаж системы автоматики котельного оборудования.	#####
20.03.2018	Приемка работ по прокладке трубопроводов ГВС и ХВС в подвале. Предварительная приемка систем вентиляции и кондиционирования.	Стр-в
29.03.2018	Выполняется армирование лестницы с цокольного на 1 этаж.	Стр-в

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взем. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет март 2018	Лист

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)	
№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	До конца не устранены замечания по ремонту цоколя
1	Устранить замечания по ремонту стен

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Контроль качества устройства стропильной системы кровли
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист
т
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Отклеилась фольгизированная лента на стыках






Конденсат на поверхности стен в подвале



Трещины в стяжке



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист
5



Провисание гибких воздуховодов.




Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист
6

Армирование лестницы



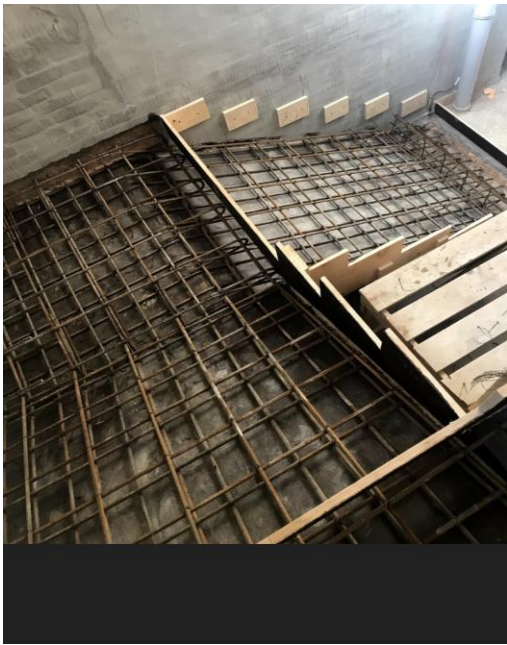

март 3 выезда.

Подп. и дата

Ине. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Ине. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018
