ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период:	**Август 2017**
Заказчик:	###############
Подрядчик:	
Адрес объекта:	
Организация осуществляющая функции строительного контроля	**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительтсво жилого дома, Отчет август 2017	Лист
						1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв № | Подп. и дата | Инв. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты *(в том числе неисполнение договорных обязательств)* выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
01.08.2017	Отдельные (локальные) участки фундаментов без теплоизоляции		Участки фундаментов без теплоизоляции завершить при устройстве отмостки
08.08.2017	Выявлено место снегового кармана, отсутствует гидроизоляция		
12.08.2017	Выдано предписание (рекомендации) по устранению снегового кармана.		

Раздел 2. Выезды *(информация по произведенным за отчетный период выездам)* **:**

Дата:	Информация по выезду:	*Инж*
01.08.2017	Устройство стропильной части кровли. Утепление фундаментов, установка защитной мембраны. Обратная засыпка пазух по оси 14	#######
08.08.2017	Устройство стропильной части кровли.	#######
15.08.2017	Устройство стропильной части кровли.	#######
30.08.2017	Кладка перегородок из блоков в цокольном этаже. Корректировка (подгонка) размеров оконных и дверных проемов на 1 и 2 этажах	#######

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. *(проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)*

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. *(оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)*

№	Наименование:
1	До конца не устранены замечания по ремонту цоколя
1	Устранить замечания по ремонту стен

Приемочный контроль. *(Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)*

№	Наименование:
1	Контроль качества устройства стропильной системы кровли
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Раздел 3. **Фотоотчет:**

Устройство теплоизоляции фундаментов.

Устройство мембраны

Выявленное место "снегового кармана" при устройстве кровли

Кладка перегородок цокольного этажа

Оформление проемов под оконные блоки 2 этажа

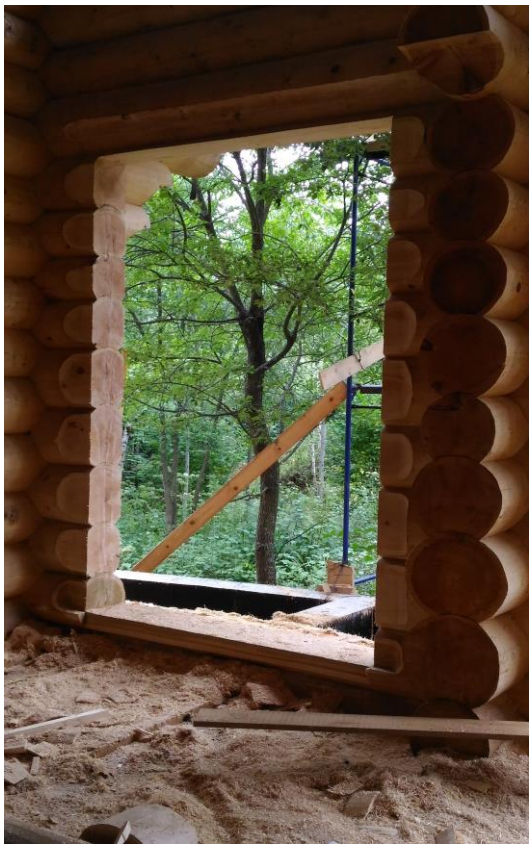

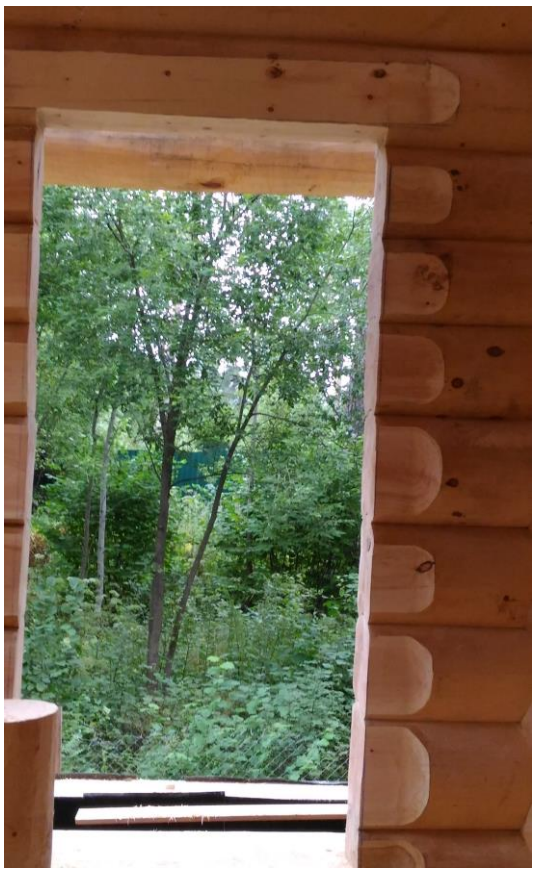

4 выезда.

К оплате за август20 000,00 руб. (35000/7*4)
