Технадзор77

Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	##################
Период:	Август2019
Подрядчик:	
Адрес:	########################

г. Москва

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв № | Подп. и дата | Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого частного дома, август 2019	Лист 1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
08.08.2019	Подрядчики на объекте отсутствуют.	устранено	

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
08.08.2019	Завезены железобетонные сваи (длина 3000 мм и сечением 200/200 мм) для устройства фундамента индивидуального жилого дома на монолитном ж/б ростверке 400мм шириной и 600 мм высотой. Повреждений свай не выявлено, количество соответствует проекту.	########
13.08.2019	Завезена техника для забивки железобетонных свай (длина 3000 мм и сечением 200/200 мм) для устройства фундамента индивидуального жилого дома на монолитном ж/б ростверке 400мм шириной и 600 мм высотой. На момент проверки идет подготовка и разбивка свайного поля.	########

ИТН ######## 2
выезда

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Раздел 3. Фотоотчет.

Завезены железобетонные сваи (длина 3000 мм и сечением 200/200 мм) для устройства фундамента индивидуального жилого дома на монолитном ж/б ростверке 400мм шириной и 600 мм высотой.

Завезены железобетонные сваи (длина 3000 мм и сечением 200/200 мм) для устройства фундамента индивидуального жилого дома на монолитном ж/б ростверке 400мм шириной и 600 мм высотой.

Завезена техника для забивки железобетонных свай (длина 3000 мм и сечением 200/200 мм) для устройства фундамента индивидуального жилого дома на монолитном ж/б ростверке 400мм шириной и 600 мм высотой.
На момент проверки идет подготовка и разбивка свайного поля.

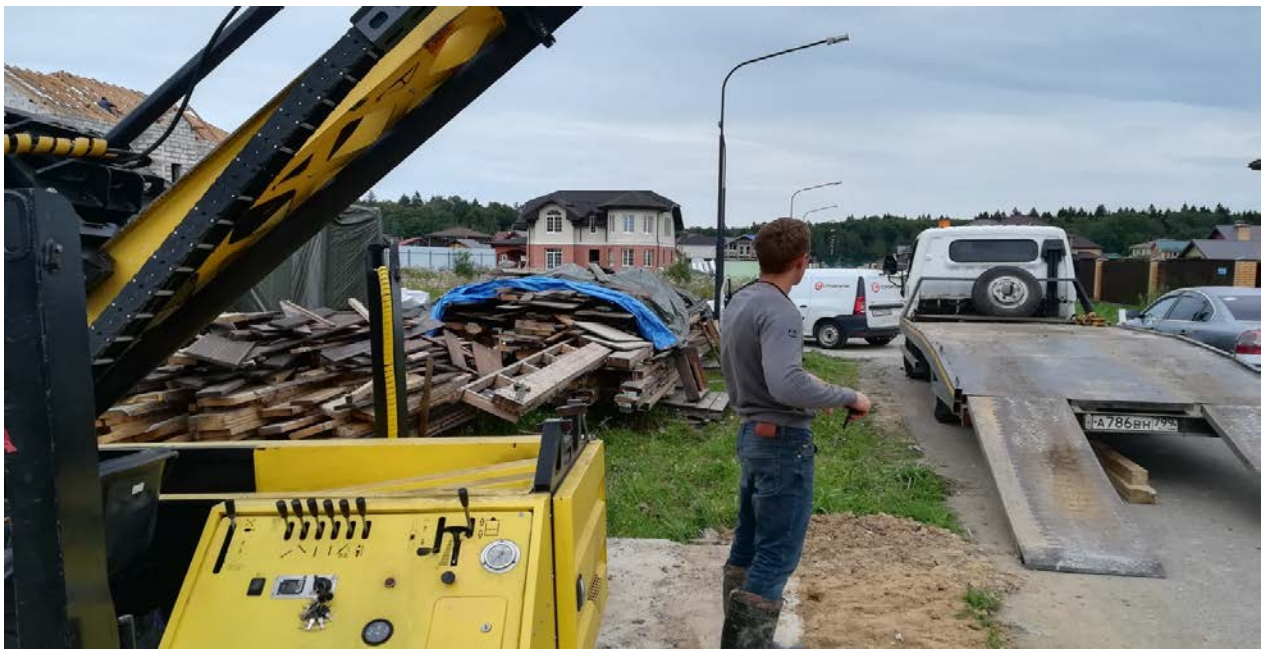

Завезена техника для забивки железобетонных свай (длина 3000 мм и сечением 200/200 мм) для устройства фундамента индивидуального жилого дома на монолитном ж/б ростверке 400мм шириной и 600 мм высотой.
На момент проверки идет подготовка и разбивка свайного поля.
